

公益项目运营案例

“为你撑伞”公益志愿服务项目

——从 0 到 1 策划运营全过程复盘报告——

一个通过青年志愿者连接高中学生的成长支持型公益项目

为你撑伞，为爱发电

文档性质：纯项目运营案例（非个人简历）

内容构成：发展历程 · 产品设计 · 志愿者体系 · 运营闭环 · 复盘分析

数据口径：以公开可核实信息为准，不确定数据使用“约”“预计”等表述

编制时间：2026 年 8 月

目 录

- 第 1 章 报告概述..... 5
 - 1.1 为什么写这份复盘报告..... 5
 - 1.2 项目是什么..... 5
 - 1.3 复盘报告的方法与框架..... 6
 - 1.4 核心结论速览..... 7
- 第 2 章 项目背景与需求洞察..... 8
 - 2.1 发起背景：从“过来人”到“撑伞人” 8
 - 2.2 目标用户：高中阶段学生画像..... 8
 - 2.3 用户需求分析..... 9
 - 2.4 问题定义：信息差与支持缺位..... 9
 - 2.5 项目定位与核心理念..... 10
 - 2.6 为什么这件事值得做..... 11
- 第 3 章 项目发展历程：从 0 到 1 的时间轴..... 12
 - 3.1 五年历程总览..... 12
 - 3.2 第一阶段：筹备与验证（2021 年 3 月—7 月） 12
 - 3.2.1 筹备期：明确方向（2021 年 3 月） 12
 - 3.2.2 方案设计期：搭建产品蓝图（2021 年 4—6 月） 13
 - 3.2.3 首次验证：线上模式跑通（2021 年 7 月） 13
 - 3.3 第二阶段：重启与正式落地（2022 年 6 月—8 月） 13
 - 3.3.1 团队搭建与方案迭代（2022 年 6 月） 13
 - 3.3.2 宣传与资源协调（2022 年 7 月） 14
 - 3.3.3 正式落地：暑期成长营开展（2022 年 8 月） 14
 - 3.4 第三阶段：持续运营（2023 年至今） 14
 - 3.5 各阶段复盘要点..... 15
- 第 4 章 项目规模与数据概览..... 16

4.1 数据说明：先说清楚口径.....	16
4.2 学生服务规模.....	16
4.3 志愿者规模与结构.....	17
4.4 数据观察与后续动作.....	18
第 5 章 核心产品：暑期成长营.....	19
5.1 产品定义：不是“活动”，是“产品”	19
5.2 产品目标与设计原则.....	19
5.3 产品形态：7 至 8 天的成长营.....	20
5.4 产品模块拆解.....	20
5.4.1 学科课程：解决“怎么学”	20
5.4.2 自习辅导：把方法用起来.....	21
5.4.3 升学规划分享：解决“往哪走”	21
5.4.4 一对一交流：解决“有人可问”	21
5.4.5 心理支持：解决“有人可聊”	22
5.5 每日流程.....	22
5.6 产品体验设计细节.....	23
5.7 产品迭代记录.....	23
第 6 章 志愿者运营体系.....	24
6.1 志愿者体系的定位：项目的“供给侧”	24
6.2 招募阶段：选对人.....	24
6.2.1 招募对象与渠道.....	24
6.2.2 筛选标准.....	24
6.3 培训阶段：交付前的“上岗认证”	25
6.4 执行阶段：分工与协作.....	25
6.5 复盘阶段：让经验回到体系.....	26
6.6 志愿者管理流程总览.....	26
6.7 志愿者的激励与留存.....	27
第 7 章 项目运营闭环.....	28

7.1 为什么需要运营闭环.....	28
7.2 运营闭环总览.....	28
7.3 十大环节拆解.....	29
7.3.1 需求分析.....	29
7.3.2 项目策划.....	30
7.3.3 资源协调.....	30
7.3.4 志愿者招募.....	30
7.3.5 培训准备.....	30
7.3.6 宣传推广.....	30
7.3.7 活动执行.....	30
7.3.8 用户反馈.....	31
7.3.9 项目复盘.....	31
7.3.10 持续优化.....	31
7.4 闭环的关键控制点.....	31
第8章 内容传播运营.....	33
8.1 传播运营的定位.....	33
8.2 传播矩阵设计.....	33
8.3 微信公众号运营.....	34
8.4 学校渠道传播.....	34
8.5 媒体传播与公信力建设.....	34
第9章 项目成果展示.....	36
9.1 成果展示的设计思路.....	36
9.2 项目影响.....	36
9.3 用户反馈展示区.....	37
9.4 媒体证明展示区.....	37
9.5 成果展示的呈现建议.....	38
第10章 项目复盘分析.....	39
10.1 复盘框架：问题—原因—解决方案.....	39

10.2 问题 1：项目数据沉淀不足.....	39
10.3 问题 2：流程依赖经验.....	40
10.4 问题 3：活动结束后用户连接不足.....	41
10.5 其他值得关注的可改进项.....	42
10.6 复盘结论：项目所处的位置.....	42
第 11 章 未来规划与可复制性.....	43
11.1 下一阶段的迭代方向.....	43
11.2 项目的可复制模型.....	43
11.3 标准化资产清单.....	44
11.4 结语：从 0 到 1，再到长期主义.....	44
附录.....	46
附录 A 项目数据速查表.....	46
附录 B 成果展示预留位索引.....	46
附录 C 本报告的使用建议.....	46

第 1 章 报告概述

1.1 为什么写这份复盘报告

《“为你撑伞”公益志愿服务项目》是一个真实存在、并持续运营多年的公益教育服务项目。它由一群经历过升学过程的高校学生发起，用青年志愿者的经验与陪伴，帮助高中阶段学生解决学习、升学与成长中的困惑。这份报告的目的，不是记录一次活动办得有多热闹，而是把项目从想法产生、方案设计、首次验证、重启落地、持续运营到复盘沉淀的完整过程，整理成一份可阅读、可分析、可借鉴的运营案例。

之所以采用“复盘报告”而非“活动总结”的写法，是因为复盘的对象不是某一场活动，而是项目本身。复盘要回答的问题是：这个项目为什么能启动？它如何从“想法”变成“产品”？在资源有限、人力有限、没有专职团队的情况下，它是靠什么机制持续运转到今天的？中途遇到了哪些问题，又是怎么解决的？这些问题，恰恰是运营工作中最常被问到、也最值得被沉淀下来的内容。

因此，这份报告的读者被设想为三类人：第一类，运营岗位的面试官或团队管理者，他们希望通过一个真实案例，判断候选人的产品思维、运营方法和复盘能力；第二类，公益项目的研究者或高校社团负责人，他们想知道一个学生公益项目如何搭建和迭代；第三类，项目内部的成员，他们需要一份完整的“项目说明书”，用来统一认知、传承经验。三类读者对报告的要求是一致的：真实、结构化、可验证。

需要说明的是，项目在早期以执行和交付为主，数据沉淀并不完整。报告中涉及规模的数据，均以“约”“左右”“预计”等口径呈现，不虚构数字。这也是本报告坚持的写作原则：**公益项目的真实性，高于报告的完美度。**

1.2 项目是什么：一句话定义

在展开任何分析之前，先给项目一个足够清晰的定义。定义是运营的起点：定义不清楚，团队对“我们到底在做什么”的理解就会分裂，后续的招募、培训、执行、传播都会跑偏。

一句话定义：“为你撑伞”是一个通过高校青年志愿者，为高中阶段学生提供学科学习支持、升学经验分享、生涯规划交流、成长陪伴与心理支持的成长支持型公益项目。

核心理念：为你撑伞，为爱发电。“撑伞”对应项目为学生提供的支持与保护，“为爱发电”则强调志愿者的参与不是完成任务，而是基于真实经验与善意的自愿投入。这一理念贯穿于志愿者招募、培训、执行的全过程，也是项目对外传播时最容易被记住的表达。

从运营视角，项目可以拆成三个相互支撑的层面：

- **产品层面**——以“暑期成长营”为核心的线下服务产品，集中承载学科课程、自习辅导、升学分享、一对一交流与心理支持五类服务；
- **组织层面**——以“准大学生志愿者”为主体的供给侧团队，解决“谁来服务、如何保证服务质量”的问题；
- **传播层面**——以微信公众号、学校渠道和媒体报道构成的传播矩阵，解决“学生怎么知道、项目如何被信任”的问题。

三个层面的关系是：产品是价值载体，组织是交付保障，传播是触达入口。任何一个层面缺失，项目都会变成“一次性活动”，而无法成为“可持续运营的项目”。后文各章将分别对这三个层面展开分析。

1.3 复盘报告的方法与框架

这份报告采用“从 0 到 1”的项目成长视角，而不是按时间平均用力。项目真正关键的节点只有几个：发起筹备（2021 年 3 月）、方案设计（2021 年 4-6 月）、首次线上验证（2021 年 7 月）、重启与团队搭建（2022 年 6 月）、正式落地（2022 年 8 月）、持续运营（2023 年至今）。围绕这些节点，报告按“需求—产品—组织—流程—传播—成果—问题”七个维度组织内容。

在分析方法上，报告混用了三种常见于互联网项目复盘的框架：

- **产品思维**：把暑期成长营当作一个“产品”来拆解，包括产品目标、用户对象、核心模块、使用流程和迭代记录；
- **运营闭环**：把项目运行抽象为“需求分析—项目策划—资源协调—志愿者招募—培训准备—宣传推广—活动执行—用户反馈—项目复盘—持续优化”的闭环，逐环节检查设计与执行情况；
- **问题复盘**：不回避问题，用“问题—原因—解决方案”的标准化结构，对项目最突出的三个短板逐一复盘，并给出可落地的改进动作。

报告的数据口径说明如下：项目早期未建立完整数据库，历年学生规模来自运营记录与团队回忆，2021 年约 30 人、2022 年约 60 人、2023 年约 100 人、2024 至 2026 年每年几十人，累计服务学生约 300 人次；志愿者以刚结束高考的准大学生为主，第二期约 20 至 30 人，后续平均十几人参与。凡涉及不确定数据，报告均使用“约”“左右”等表述，并在附录中给出数据速查表，方便读者核对口径。

1.4 核心结论速览

在展开正文之前，先把本次复盘最核心的结论放在最前面，方便读者快速建立全局认知。这六条结论贯穿报告始终，后文各章会给出对应的详细论证：

1. **真实需求是项目启动的第一动力。**项目源于发起者自身的升学经历，团队成员都切身感受过信息不足、规划不足带来的困扰，“用自己的经验帮更多人”这一动机足够真实，支撑项目度过了最困难的起步阶段。
2. **最小验证降低了试错成本。**2021 年因疫情调整为线上开展，反而让项目以极低成本完成了服务模式验证，证明“青年志愿者—高中学生”的配对模式可行，为 2022 年线下重启提供了信心。
3. **产品需要可复用的最小结构。**暑期成长营被设计成“破冰+课程+自习+分享+一对一”的标准化结构，7 至 8 天的周期既能承载完整服务，又不至于消耗过多志愿资源，成为项目可以每年复制的最小产品单元。
4. **志愿者体系决定供给质量。**项目把志愿者当作“供给侧团队”运营，按招募、培训、执行、复盘四个阶段管理，才保证了多期活动中服务质量的稳定。
5. **运营闭环是持续运转的机制保障。**项目运行不是“办完一场就结束”，而是通过用户反馈、项目复盘、持续优化形成闭环，使每年暑期的活动都能比上一期更成熟。
6. **数据沉淀和标准化是下一阶段瓶颈。**早期重执行、轻沉淀，导致数据不足、流程依赖个人经验、活动结束后与用户连接减弱；这三个问题正是项目从“能做”走向“可复制”的关键障碍。

第2章 项目背景与需求洞察

2.1 发起背景：从“过来人”到“撑伞人”

每一个项目的起点，往往不是宏大的使命，而是一个具体的、真实的痛点。项目团队在自身升学过程中，普遍经历过两类困境：一是信息获取不足，对大学、专业、升学路径的了解基本停留在“道听途说”层面；二是规划不足，学习目标模糊，不知道现阶段该重点做什么，更不知道如何为未来做选择。这些困境不是个例，而是高中阶段学生中的普遍现象。

团队在进入大学后回头看，发现当年困扰自己的很多问题，其实是可以被“过来人”的经验提前化解的。比如某个专业到底学什么、大学和高中在学习方式上的差异、填报志愿时应该考虑哪些维度、如何管理自己的备考节奏等。这些经验谈不上高深，但恰好是高中学生最缺、也最不容易获得的信息。于是，团队产生了一个朴素的想法：既然我们淋过雨，不如为正在经历同样阶段的学弟学妹们撑一把伞。

这一动机决定了项目的气质：它不是自上而下的“施助”，而是基于共同经历的同辈支持。志愿者与学生年龄相近、经历相似，天然具备信任基础；志愿者讲的是自己刚刚走过的路，可信度高、可操作性强。这种“过来人”身份，构成了项目区别于一般辅导机构的底层逻辑。

2.2 目标用户：高中阶段学生画像

项目的目标用户是高中阶段学生。这个群体处于成长的关键窗口期：学业压力大、升学决策临近、自我认知和生涯规划能力正在形成，同时也是心理健康问题的易发阶段。团队在项目筹备期对目标用户做了初步的需求梳理，虽然没有进行大规模的问卷调查，但通过发起者自身的经历、身边同学的经验以及早期与学生的沟通，归纳出了用户画像的核心特征。

从信息层面看，高中学生对大学和专业了解不足。多数学生在填报志愿前，对专业培养方向、就业前景、院校差异缺乏系统认知，信息来源主要是家长、老师和网络碎片信息，缺少“正在读这个专业的人”的一手经验。

从方法层面看，学生的学习方法和规划能力不足。不少学生不是不努力，而是不会学：不会做错题管理、不会安排复习节奏、不知道如何根据自身情况调整策略，长期低效学习容易带来挫败感。

从成长层面看，学生缺少陪伴和交流。高中阶段课业紧张，学生与家长、老师之间的交流大多围绕成绩展开，情绪压力、成长困惑缺少安全的倾诉出口。上述三类问题叠加，构成了项目的需求基础。

2.3 用户需求分析

需求分析是项目设计的第一张图纸。为了避免“拍脑袋设计服务”，团队把观察到的用户问题整理成需求清单，并为每一项需求匹配对应的项目响应，形成下表：

表 1 用户需求分析表

需求类别	典型表现	问题根源	项目响应
学科学习支持	学习方法低效、偏科、备考节奏混乱	缺少科学方法与反馈机制	学科课程、自习辅导、答疑
升学经验分享	不了解大学与专业、志愿填报迷茫	信息渠道单一、缺少一手经验	高校经验分享、专业选择交流
生涯规划交流	目标模糊、缺乏方向感、不会做选择	规划意识与工具不足	生涯规划分享、一对一咨询
成长陪伴	压力大、孤独感强、缺少倾诉对象	成长陪伴与心理支持缺位	破冰活动、游戏互动、陪伴沟通

注：需求清单来自项目筹备期访谈、发起者经历与运营中的用户沟通，为定性梳理，非抽样调查结论。

上表揭示了需求分析的两个关键判断。第一，学生的需求不是单一维度的，而是“学习—升学—规划—心理”的组合需求，这决定了产品必须采用模块化设计，而不是只做辅导。第二，需求之间存在优先级差异：学科学习是刚需，决定了学生参与意愿；升学与规划是增值，决定了项目的信息价值；陪伴与心理支持是黏性，决定了学生对项目的情感认同。三者共同构成了成长营“留得住人、帮得上忙、记得住情”的产品基础。

2.4 问题定义：信息差与支持缺位

如果把需求进一步抽象，可以发现高中学生面对的核心问题可以归纳为两个词：**信息差**与**支持缺位**。

信息差指的是学生与大学、专业、升学路径之间的信息断层。一个学生从高中走向大学，要经历选科、备考、志愿填报、入学适应等多个决策点，每个决策点都需要大量信息支撑。城市和

资源条件较好的学生可以通过讲座、咨询机构、家长人脉获得这些信息，而缺乏资源的学生往往只能依赖有限渠道，选择空间因此被压缩。这种差距不是能力差距，而是信息获取机会的差距。

支持缺位指的是学生成长过程中缺少“学习之外”的陪伴性支持。学科辅导市场供给充足，但能够站在学生角度、理解其阶段困惑、提供长期陪伴的支持者很少。家长关心成绩但未必懂升学，老师负责教学但精力有限，同龄朋友同样身处信息茧房，这种结构性的支持缺位，正是公益项目可以发挥作用的空间。

因此，项目解决的问题不是“帮学生多考几分”这样单一的结果指标，而是通过经验传递和成长陪伴，**降低高中学生成长过程中的信息差**。这一判断决定了项目的服务边界：不替代学校教学，不承诺分数提升，而是做好学校与家庭之外的“第三类支持”。

2.5 项目定位与核心理念

基于需求分析，项目将自身定位为：**面向高中阶段学生的成长支持型公益项目**。所谓“成长支持型”，意味着服务对象是“人”而不是“分数”，服务目标是学生的整体成长体验——包括学业方法、升学认知、规划能力和心理状态。

项目核心理念“为你撑伞，为爱发电”，在运营层面有三层含义：

- **平等**：志愿者与学生不是“老师与学生”的上下级关系，而是“过来人与正在经历者”的同行关系，服务过程中强调尊重与平等沟通；
- **真诚**：分享的内容必须是志愿者真实经历过、验证过的经验，不包装、不虚构，学生可以随时追问细节；
- **可持续**：“为爱发电”承认志愿者付出不求物质回报，但项目运营必须为志愿者的付出提供组织支持、培训保障和情感回报，让善意能够持续，而不是消耗殆尽。

这一定位同时划定了项目的边界：项目是公益性质，不以营利为目的；项目服务以经验分享和陪伴为主，不承诺学业成绩的量化提升；项目以暑期成长营为核心场景，日常通过线上内容保持连接。边界清晰，是项目多年没有走偏的重要原因。

2.6 为什么这件事值得做

从价值维度看，项目至少在三方面创造了可被观察的价值。**对学生而言**，项目提供了课本之外的升学经验与成长陪伴，降低了信息差带来的选择焦虑；对参与过成长营的学生来说，这段经历还提供了一群可以长期联系的“学长学姐”，其价值在营期结束后仍然延续。

对志愿者而言，项目是一个低成本、高质量的社会实践场景。准大学生在高考后到入学前的空窗期，通过备课、授课、答疑、组织活动，锻炼了表达沟通、时间管理和团队协作能力；同时，以志愿者身份回看自己的升学经历，本身也是一次自我梳理与成长。志愿服务不是单向付出，而是双向价值。

对社会而言，项目提供了一个“青年经验反哺教育”的轻量样本。它不依赖大额资金和专职团队，靠的是青年志愿者的时间与善意、学校与媒体的支持，验证了一种低成本可持续的公益教育服务模式。这种模式能否规模化，正是本报告第 10 章、第 11 章要重点讨论的问题。

第 3 章 项目发展历程：从 0 到 1 的时间轴

3.1 五年历程总览

项目的成长不是一个平滑上升的过程，而是经历了“筹备—验证—中断—重启—落地—持续运营”的完整生命周期。2021 年 3 月项目开始筹备，同年 7 月完成首次线上验证；2022 年重启并正式落地线下成长营；2023 年至今进入持续运营阶段。下图是项目的完整发展时间轴：

为你撑伞·项目发展时间轴（2021—2026）



图 1 项目发展时间轴（2021—2026）

这张时间轴呈现了几个容易被忽视的事实。第一，项目从筹备到正式落地，中间经历了约一年半的反复，说明“从 0 到 1”不是一蹴而就的。第二，2021 年的线上验证虽然规模小、形式简单，但它承担了“模式验证”的功能，为后续重启保留了火种。第三，项目真正进入稳定节奏是在 2023 年之后，此时团队才逐渐把精力从“把活动办成”转向“把项目做好”。下面按三个阶段展开说明。

3.2 第一阶段：筹备与验证（2021 年 3 月—7 月）

3.2.1 筹备期：明确方向（2021 年 3 月）

2021 年 3 月，团队正式启动项目筹备。这一阶段的工作重心不是马上设计方案，而是回答三个前置问题：项目到底服务谁？服务什么需求？用什么形式服务？团队通过回顾自身升学经历、访谈身边的高中师生、观察现有辅导与公益服务的供给情况，最终明确了两个方向性判断：服务对象锁定高中阶段学生；服务内容聚焦经验分享与成长支持，而不是简单的课业补习。

这一阶段的产出主要是“项目方向说明书”：用一页纸写清楚服务对象、核心需求、价值主张和初步服务模式。这份看似简单的文档，实际上承担了团队对齐认知的功能——在后续方案设计出现分歧时，所有人都能回到最初的方向上重新校准。

3.2.2 方案设计期：搭建产品蓝图（2021 年 4—6 月）

方向确定后，团队进入方案设计阶段，用时约三个月。主要工作有三项：一是设计“暑期成长营”的整体模式，把服务浓缩为 7 至 8 天的集中营期；二是规划课程体系，初步确定学科课程、升学分享、生涯规划等模块及其内容大纲；三是设计活动流程，包括破冰、每日作息、人员分组、场地与物料需求等。

设计过程中，团队始终坚持“以学生的真实场景为起点”的原则。例如，课程时间要贴合学生暑期作息，分享内容要先由志愿者试讲并修改，破冰环节要设计得能让内向学生也自然参与。这些细节在第一次正式执行时被证明至关重要。

3.2.3 首次验证：线上模式跑通（2021 年 7 月）

2021 年 7 月，项目迎来首次落地。受疫情影响，原计划的线下活动无法开展，团队临时将活动调整为线上形式。这次调整看似是“退而求其次”，客观上却带来两个好处：一是大幅降低了场地、物料、人员组织的成本，使小规模测试更容易完成；二是线上形式下志愿者的备课与交付同样要完整走一遍，相当于对服务模式做了一次压力测试。

首次验证完成了两件事：**活动测试与服务模式验证**。活动测试检验了课程内容、互动形式、流程安排在真实场景中是否可行；服务模式验证则回答了更本质的问题——“高校青年志愿者与高中学生之间的经验传递关系是否能够建立”。结果是肯定的：学生在线上仍然愿意提问、愿意分享，志愿者也获得了真实的交付体验。这次验证为 2022 年的重启积累了信心，也留下了第一批可改进的细节清单。

3.3 第二阶段：重启与正式落地（2022 年 6 月—8 月）

3.3.1 团队搭建与方案迭代（2022 年 6 月）

2022 年 6 月，项目重启。与 2021 年相比，重启后的最大变化是从“个人项目”走向“团队项目”：团队开始正式招募志愿者、搭建执行团队，并按功能分工设置负责人，涵盖课程、活动、宣传、后勤等模块。同时，团队基于 2021 年验证中积累的问题清单，对活动方案做了系统性完善，包括增加课程试讲机制、细化每日流程、明确志愿者岗位职责。

这一阶段的关键认知是：**方案的生命力来自执行团队的消化能力**。再好的方案，如果执行者不理解设计意图，落地时也会变形。因此，2022 年团队把方案迭代与志愿者培训放在一起推进，让志愿者在了解“为什么这么设计”之后再进入执行。

3.3.2 宣传与资源协调（2022 年 7 月）

7 月进入宣传与资源协调阶段。宣传方面，团队采用“地推+学校沟通”的组合方式：地推面向学生和家长集中出现的地点发放活动信息，学校沟通则通过联系学校老师，将项目信息传递到目标学生群体。资源协调方面，团队需要解决场地、排期、人员组织等问题，并与学校确认合作方式与安全事项。

这一阶段暴露了项目在传播上的一个真实短板：宣传主要依赖线下人力和熟人网络，缺少线上的系统化传播。这个问题在第 8 章“内容传播运营”中会进一步分析，它也是项目后续开通微信公众号、持续更新内容的直接动因。

3.3.3 正式落地：暑期成长营开展（2022 年 8 月）

2022 年 8 月，暑期成长营正式开展，这是项目第一次完整落地线下模式。成长营覆盖了学科课程、自习辅导、升学分享、学生陪伴四大板块：上午由志愿者按学科开展学习方法与知识辅导，下午安排自习与答疑，穿插高校经验与升学路径分享，同时通过日常陪伴和互动建立志愿者与学生之间的信任关系。

从运营数据看，2022 年暑期服务学生约 60 人，志愿者规模约 20 至 30 人，服务规模较 2021 年明显放大。更重要的是，这次落地验证了线下模式的可执行性：场地、排期、人员分工、课程节奏都经受住了真实运行的检验。此后，暑期成长营成为项目每年复用的核心产品形态。

3.4 第三阶段：持续运营（2023 年至今）

2023 年起，项目进入持续运营阶段。这一阶段的工作不再是“从 0 到 1”的突破，而是“从 1 到 N”的积累，主要包含四类动作：每年暑期按标准流程开展活动，保持服务的连续供给；持续更新微信公众号内容，记录活动、呈现学生成长故事、展示项目成果；逐步优化项目流程，把前几期出现的问题转化为改进动作；沉淀项目经验，将可复用的方法、模板、文档整理成团队资产。

持续运营阶段最值得关注的变化，是项目团队工作重心的迁移：从“办活动”转向“运营项目”。办活动关注的是某一次交付是否成功；运营项目关注的则是供给是否稳定、质量是否一致、经

验是否沉淀、用户是否持续连接。这个迁移是质的改变，也是项目能维持多年而不是“一届就散”的根本原因。

3.5 各阶段复盘要点

下表汇总了项目各发展阶段的核心动作、关键产出与阶段经验，便于读者快速对照：

表 2 项目发展阶段一览表

阶段	核心动作	关键产出	阶段经验
筹备期 (2021.03)	明确方向、需求分析、模式初设	项目方向说明书	先对齐方向，再动手设计
方案设计期 (2021.04—06)	设计成长营模式、课程体系、活动流程	产品蓝图与课程大纲	用学生真实场景校验设计
首次验证期 (2021.07)	线上开展活动测试	模式可行性验证	小成本验证，保留改进清单
重启期 (2022.06)	招募志愿者、搭建团队、完善方案	执行团队与迭代方案	方案要靠团队消化才能落地
宣传协调期 (2022.07)	地推宣传、学校沟通、资源协调	生源与资源准备	线下传播见效快、覆盖面有限
正式落地期 (2022.08)	线下成长营完整执行	约 60 人服务规模	标准化流程通过真实运行检验
持续运营期 (2023 至今)	每年开展、内容更新、流程优化、经验沉淀	年度运营节奏	从“办活动”转向“运营项目”

第 4 章 项目规模与数据概览

4.1 数据说明：先说清楚口径

在呈现数据之前，有必要先说明数据口径，这是复盘报告专业性的体现。项目早期未建立统一的数据库，历年数据主要来自运营记录、团队记忆与公开信息，因此本报告对规模数据统一采用区间与“约”字表述：年份数据反映当年暑期成长营的学生参与规模，志愿者数据反映当期的实际参与人数，累计数据为各年规模的估算之和。口径不实的数据不如没有数据，这是本报告坚持的原则。

4.2 学生服务规模

从历年数据看，项目学生规模呈现“增长—回落—稳定”的走势。2021 年首次线上验证约 30 人；2022 年线下重启后放大约至 60 人；2023 年达到峰值，约 100 人；2024 年至 2026 年，每年规模回落到几十人区间。各年数据如下表：

表 3 历年学生服务规模（约值）

年份	服务规模	形式与说明	数据可信度
2021	约 30 人	线上验证，规模最小	运营记录+团队回忆
2022	约 60 人	线下成长营首次落地	运营记录
2023	约 100 人	规模峰值，影响力集中释放	运营记录
2024	几十人	持续运营，规模回落	运营记录，精确数待补
2025	几十人	持续运营	运营记录，精确数待补
2026	几十人	持续运营（预估）	预计口径
累计	约 300 人次	2021—2026 年综合估算	估算口径

注：2024—2026 年按“每年几十人”口径综合估算，累计约 300 人次。

将历年数据可视化后，可以更直观地看到规模变化的形态：

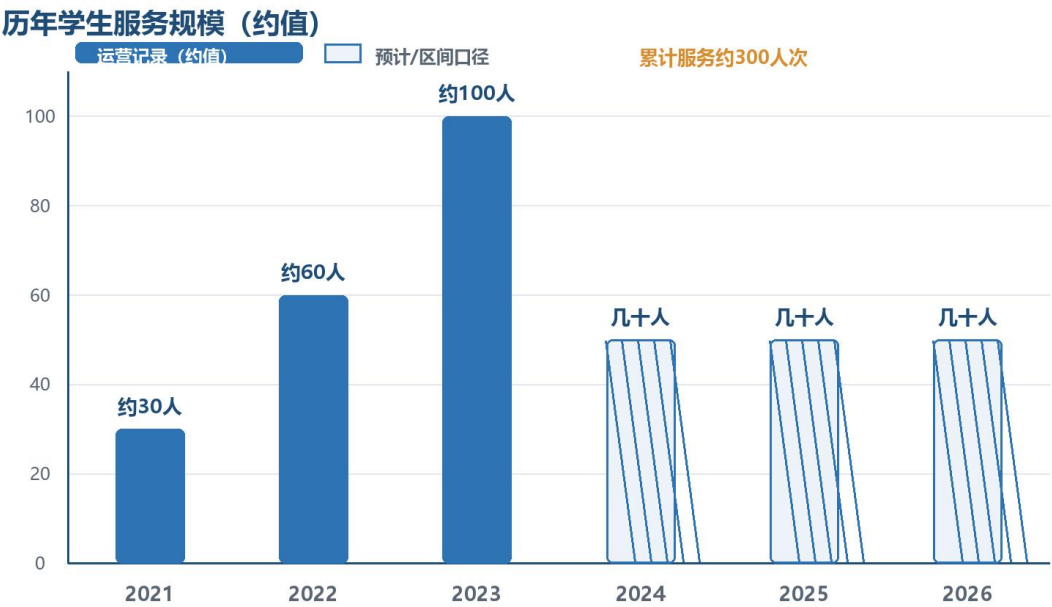


图 2 历年学生服务规模 (约值)

对这张图需要做两点解读。第一，2023 年的规模峰值不是偶然的：它对应项目口碑积累、学校合作深化、传播动作密集释放的叠加效应，说明项目并非没有增长能力，而是增长之后缺少承接机制。第二，2024 年之后的规模回落，不能简单归因为“项目变差了”，更接近运营节奏的自然结果——团队以稳定交付为先，没有刻意追求规模扩张，同时受团队精力、资源协调等现实约束，规模维持在团队可控的水平。规模回落本身是复盘素材，而不是失败证据。

4.3 志愿者规模与结构

志愿者是项目的供给侧。志愿者主要来源是刚结束高考的准大学生：这一群体正处于高中到大学的过渡期，升学经验最新鲜、表达欲望最强、暑期时间最完整，与目标用户之间的年龄与认知距离最近，是最理想的服务提供者。

从规模看，2022 年第二期约 20 至 30 人，是志愿者参与的高峰；此后平均十几名志愿者参与每期活动。志愿者规模与学生规模基本匹配，说明团队在招募时遵循“供给与需求匹配”的原则，而不是盲目追求志愿者数量。志愿者结构上，团队以当届准大学生为主力，同时保留少量往届志愿者参与统筹与带教，形成了“新志愿者执行、老志愿者带教”的梯队雏形。

表 4 志愿者规模与角色结构 (约值)

维度	规模区间	角色构成	说明
----	------	------	----

维度	规模区间	角色构成	说明
第二期（2022）	约 20—30 人	准大学生为主	规模峰值
后续各期	平均十几人	新志愿者+往届带教	稳定供给
角色分工	—	课程/活动/宣传/后勤	按职能分组管理

4.4 数据观察与后续动作

把学生与志愿者两组数据放在一起看，可以得到三个观察结论。**第一，项目的服务效率是可维持的：**约 10 至 30 名志愿者服务几十至一百名学生，人均服务规模在公益项目中处于合理区间，未出现供给严重不足或资源浪费的情况。**第二，规模与质量之间存在取舍：**2023 年规模最大，但同期团队也感受到执行压力增加、个性化服务比重下降，这提示项目不应盲目追求人数指标。**第三，数据基础设施是当务之急：**正因为早期数据沉淀不足，本报告只能呈现“约值”，这也直接对应第 10 章复盘中“数据沉淀不足”这一核心问题的改进方向。

基于以上观察，项目在数据层面制定了明确的后续动作：建立覆盖“招募—报名—执行—反馈”的项目数据库；为每期活动设定统一的数据采集项，包括学生人数、课程完成情况、满意度、志愿者投入时长等；将数据整理纳入每期复盘的标准流程，让“凭感觉复盘”变成“看数据复盘”。这些动作的详细设计见第 10 章。

此外，现有数据记录中还有两个维度不完整，值得在数据库建设中重点补充：一是学生的来源结构，包括年级分布、学科偏好、所在学校等信息，它直接影响课程设计的针对性；二是志愿者的持续参与情况，包括往届志愿者是否回归、以什么角色回归，它直接影响人才梯队的厚度。这两类数据在早期记录中基本缺失，已纳入项目数据库的字段设计清单，作为下一期采集的重点。

第5章 核心产品：暑期成长营

5.1 产品定义：不是“活动”，是“产品”

很多公益项目的问题在于：办一场活动容易，把活动做成可复用、可迭代、可解释的“产品”很难。项目团队从一开始就刻意用产品思维来设计暑期成长营，而不是把它当作一场“内容丰富的聚会”。两者的差别体现在三个层面：活动是一次性的，产品是可复用的——成长营的课程模块、流程文档、志愿者分工在每期之间可以复用和优化；活动以当天完成为目标，产品以用户价值为目标——成长营每一个模块都要回答“学生得到了什么”；活动靠热情驱动，产品靠机制驱动——成长营的运行依赖标准流程和岗位分工，而不是依赖某几个人的超常发挥。

基于这一定义，暑期成长营的产品说明书可以概括为：**面向高中阶段学生、由高校青年志愿者交付、为期7至8天的集中式成长支持服务**。它是项目所有能力（需求理解、志愿者运营、课程设计、组织协调）的集中载体，也是项目对外建立认知的核心抓手。

5.2 产品目标与设计原则

产品目标决定了产品设计的方向。成长营的目标不是“完成课程”，而是让学生在这7至8天里获得四样东西：**可用的学习方法**（知道怎么学）、**真实的升学认知**（知道往哪走）、**一对一的交流体验**（有人可问）、**被陪伴的安全感**（有人可聊）。这四样东西分别对应学科支持、升学信息、个性咨询与心理陪伴，共同构成成长营的价值主张。

围绕产品目标，设计遵循四项原则：

- **以学生为中心**：所有模块的设计起点是学生的真实场景，课程时间贴合暑期作息，分享内容必须来自志愿者的真实经历，禁止照搬网上的空泛内容；
- **结构清晰、节奏分明**：营期被拆成“破冰—课程—收尾”的清晰结构，每天固定作息，让学生和志愿者都能快速进入状态；
- **供给能力匹配**：产品设计不超出志愿者团队的实际交付能力，每个模块都配有明确的负责人和准备材料；
- **体验大于形式**：宁可少安排一个环节，也要保证每个环节的体验完整，避免“安排了很多、什么都没做好”。

5.3 产品形态：7 至 8 天的成长营

成长营的周期被设计为 7 至 8 天。这个长度不是随意确定的：太短，破冰刚完成、信任关系刚建立，服务就结束了，价值无法充分释放；太长，对志愿者和学生的时间投入要求过高，招募和参与的难度都会上升。7 至 8 天刚好覆盖“建立信任—密集服务—完成沉淀”的完整服务弧线。

从结构上看，成长营呈现“一头一尾、中间密集”的形态：第一天以破冰为主，解决信任问题；中期每天上午、下午安排课程与服务，是价值交付的密集区；最后阶段安排收尾交流，帮助学生带走可用的资料与可延续的关系。产品结构如下图所示：

暑期成长营产品结构（周期：7—8天）



图 3 暑期成长营产品结构示意图

图中可以看出，成长营不是课程的简单堆叠，而是按“关系建立—价值交付—关系沉淀”的逻辑组织的。第一天破冰解决的是“学生愿不愿意开口”的问题，这是后续所有服务生效的前提；中间密集模块解决“学生能得到什么”的问题；收尾环节解决“活动结束后留下什么”的问题。三者缺一不可。

5.4 产品模块拆解

5.4.1 学科课程：解决“怎么学”

学科课程是成长营的基础模块，包含学习方法分享、学科知识辅导与学习经验交流三类内容。学习方法分享聚焦通用能力，如错题管理、时间规划、复习节奏、专注力训练等；学科知识辅导按学科分组开展，志愿者结合自身强项学科，针对学生的具体问题答疑讲解；学习经验交流则更开放，由志愿者分享自己高中阶段的真实经历，包括踩过的坑和调整过程。

学科课程的设计遵循“经验优先于知识”的原则：不追求系统讲授学科知识，而是把重点放在“方法”和“经验”上。原因很简单——7至8天的时间无法替代学校的系统教学，但足以改变学生的学习方法；方法一旦改变，收益是长期的。

5.4.2 自习辅导：把方法用起来

自习辅导模块解决“知道了方法，但用不起来”的问题。每天安排固定时段让学生自主学习，志愿者在场答疑与监督。这个模块的价值有三层：一是提供即时反馈，学生遇到问题可以马上得到解答，避免问题积压；二是营造学习氛围，集体自习的场域能有效提升专注度；三是让志愿者观察学生的真实学习状态，为后续一对一交流提供素材。

自习辅导对志愿者的要求是“在场而不打扰”：学生没有求助时不主动干预，保持自习环境的安静；学生求助时及时响应，先问清问题再给方法，而不是直接给答案。这一规则在志愿者培训中被反复强调。

5.4.3 升学规划分享：解决“往哪走”

升学规划分享是成长营区别于一般辅导班的核心模块，内容包括高校经验、专业选择与升学路径三大主题。高校经验分享让志愿者介绍自己所在大学的学习生活，帮助学生建立对大学的真实认知；专业选择交流围绕“专业到底学什么、适合什么人、就业方向如何”展开，强调一手信息；升学路径分享则覆盖高考、志愿填报、多元升学等议题，帮助学生对未来路径形成整体认知。

这一模块坚持“真实分享、观点多元”的原则：志愿者只讲自己的真实体验，允许不同专业、不同学校的志愿者给出不同视角，不替学生做选择，而是把选择所需的信息和思考框架交给学生。

5.4.4 一对一交流：解决“有人可问”

一对一交流是成长营最具“产品感”的设计。学生可以主动找到对应志愿者，进行学习交流、生涯规划咨询或个人问题沟通。与公开课程相比，一对一交流提供了三个独特价值：私密性，学生可以问公开场合不好意思问的问题；针对性，交流内容完全围绕学生个人的具体情况展开；信任感，一对一场景更容易建立深层信任。

为了保证一对一交流的质量，项目设置了基础机制：为每位学生匹配“对应志愿者”，形成相对稳定的结对关系；志愿者接受沟通技巧培训，学会倾听、追问与回应；交流结束后志愿者在团队内部同步关键信息（不涉及隐私细节），以便后续服务衔接。

5.4.5 心理支持：解决“有人可聊”

心理支持不是独立的“心理课”，而是渗透在交流活动、游戏互动与陪伴沟通中的支持性设计。成长营通过轻松的游戏互动打破学生的防御，通过日常陪伴让学生感受到“被看见”，通过交流活动为学生提供表达情绪的安全空间。志愿者在此过程中的角色是“真诚的倾听者”而非“问题解决者”：不评判、不灌输，先理解、再陪伴。

项目对心理支持设有明确的边界：志愿者提供的是同辈陪伴与支持，不承担专业心理咨询职能。遇到需要专业帮助的情况，团队会引导学生寻求学校心理老师或专业机构支持。边界清晰，既保护了学生，也保护了志愿者。

5.5 每日流程

成长营的每日流程是产品结构的落地载体。下表以 8 天营期为例，展示典型日程安排（实际执行会根据期次微调）：

表 5 暑期成长营每日流程表（示例）

日程		时间安排	内容	设计目的
第一天	全天		破冰活动：自我介绍、分组游戏、团队公约	消除陌生感，建立信任，营造氛围
第二天至第七天	上午	09:00—11:30	学科课程：学习方法分享、知识辅导、经验交流	交付学习方法与知识支持
第二天至第七天	下午	14:00—17:00	自习辅导+答疑；穿插升学规划分享	即时反馈，使用所学方法
第二天至第七天	晚间	19:00—20:30	一对一交流、兴趣活动、陪伴沟通	个性咨询与情感连接
第八天	全天		收尾：成果回顾、反馈收集、合影与后续连接	沉淀收获，延续关系

注：日程为典型结构，实际执行按当期安排微调，午休与用餐时间未列入。

每日流程的设计有两条主线。**时间主线**上，上午以高认知负荷的课程为主，下午以自主练习与答疑为主，晚间以低强度交流为主，符合学生的注意力曲线；**关系主线**上，从第一天建立信任，到中期密集互动，再到收尾沉淀关系，服务深度逐日递进。两条主线叠加，保证了成长营每一天都有明确的功能，而不是“每天重复”。

5.6 产品体验设计细节

除了模块与流程，成长营的产品体验还体现在一些容易被忽视的细节上。例如，破冰活动不使用“自我介绍轮流发言”这种让内向学生紧张的形式，而是设计成小组游戏，让关系在共同任务中自然建立；课程材料在课前由志愿者试讲修改，避免“分享变成念 PPT”；学生对志愿者的称呼不设“老师”，而是以“学长学姐”相称，从语言层面强化平等的同伴关系；活动结束后保留学生与志愿者的联系方式，让服务关系得以延续。

这些细节的共同特征是：**它们都服务于“让学生感到安全、被尊重”这一底层体验**。对于处于高压阶段的青少年而言，安全感是接受帮助的前提。产品设计的功力，往往不在大结构，而在这些决定“学生愿不愿意打开自己”的细节里。

5.7 产品迭代记录

成长营作为产品，每年都在迭代。可梳理的迭代方向包括：课程体系从“志愿者有什么讲什么”走向“按学生需求排课”，逐步形成稳定的模块大纲；流程文档从口头经验走向书面 SOP，降低新人上手的理解成本；一对一交流从“随机安排”走向“结对匹配+记录跟进”，提升服务连续性；收尾环节从“合影结束”走向“反馈收集+关系沉淀”，为复盘和长期运营积累素材。

表 6 暑期成长营迭代要点记录

迭代方向	早期状态	迭代后状态	迭代价值
课程体系	志愿者自拟内容	按需求模块化排课	供给与需求对齐
流程管理	口头经验传递	书面 SOP 沉淀	降低新团队上手成本
一对一交流	随机安排	结对匹配+记录跟进	服务连续可追踪
收尾环节	合影即结束	反馈收集+关系沉淀	支持复盘与长期运营

第6章 志愿者运营体系

6.1 志愿者体系的定位：项目的“供给侧”

对一个以人力为核心资源的公益项目而言，志愿者就是供给侧。供给侧的质量直接决定交付质量：志愿者强，则课程、答疑、陪伴的质量有保障；志愿者弱，再好的方案也会在执行中走样。因此，项目参照企业团队管理的方式，将志愿者运营拆成“招募—培训—执行—复盘”四个阶段，并对每个阶段设定明确的目标、动作和产出。

志愿者运营体系的设计遵循三个原则。**第一，双向匹配**：招募不是“有人来就行”，而是按项目需求筛选，志愿者兴趣与岗位匹配。**第二，过程管理**：培训、执行、复盘环环相扣，避免“招进来就放养”。**第三，可持续**：让志愿者在付出中有所获得，通过带教机制和情感回报维持参与热情，形成可循环的志愿者梯队。

6.2 招募阶段：选对人

6.2.1 招募对象与渠道

志愿者主要招募对象是刚结束高考的准大学生。这一选择基于四个理由：经验最新鲜，刚刚经历完整升学过程，分享内容贴近学生需求；时间最完整，高考结束到大学开学之间的空窗期与成长营时间高度吻合；动机最真诚，刚从“被帮助的需要”中走出来，对“帮助他人”有切身认同；能力可塑，这一阶段志愿者的沟通、组织能力正处于快速成长期，愿意投入培训。

招募渠道以线上社群传播为主，包括高中校友群、大学新生群、同学朋友转介绍等熟人网络，辅以学校老师的推荐。熟人网络的信任背书，使招募到的志愿者在动机和可靠性上更有保障；同时，往届志愿者的转介绍也为每期招募提供了稳定入口。

6.2.2 筛选标准

项目采用“动机优先、能力匹配”的筛选逻辑，核心考察四个维度：是否认同项目理念（认同志愿服务，而非功利性参与）；是否具备责任心（能否承诺全程投入，而非中途退出）；是否具备基本的表达与沟通能力（能否把经验讲清楚、与学生顺畅交流）；是否具备可贡献的内容（在学科、专业或活动组织上有可输出的价值）。筛选方式以报名表+线上面谈为主，面谈重点不是考核“口才”，而是确认动机和承诺度。

表 7 志愿者招募画像与筛选标准

考察维度	筛选要点	考察方式	筛选权重
理念认同	认同公益理念与“撑伞”精神	报名表+面谈	高
责任心	全程承诺、时间可保障	面谈确认	高
表达沟通	表达清晰、善于倾听	线上面谈	中
内容贡献	有学科、专业或组织特长	报名表自述	中

6.3 培训阶段：交付前的“上岗认证”

志愿者培训是质量控制的第一个关键关口。培训不是简单的“开会说明”，而是让志愿者完成从“有经验的人”到“能交付服务的人”的转变。培训内容覆盖四个模块：**项目介绍**（项目背景、理念、服务对象与边界）、**服务理念**（平等尊重、真实分享、边界意识）、**沟通技巧**（倾听、提问、回应、处理敏感话题）、**学生管理**（课堂组织、自习纪律、突发事件应对）。

培训采用“集中培训+分组演练+试讲反馈”的组合方式。集中培训统一认知；分组演练让志愿者在模拟场景中练习沟通与授课；试讲反馈要求每位承担课程的志愿者先试讲、再由团队反馈修改，通过后才能正式上台。这一机制确保了对外交付的内容质量，也避免了“临场发挥型”的不确定性。

培训阶段还有一个容易被忽略的设计：**志愿者之间的相互认识**。执行期的高强度协作建立在熟悉与信任之上，培训期间的破冰与团建，让志愿者团队先于学生团队完成“融合”，这是执行顺利的隐性前提。

6.4 执行阶段：分工与协作

执行阶段是志愿者体系的“战时状态”。为了保证数十名志愿者在 7 至 8 天内高效协作，项目按职能进行岗位分工，明确每个岗位的职责边界与协作关系。典型岗位包括：课程组（负责课程设计与授课）、活动组（负责破冰与日常活动）、宣传组（负责影像记录与内容素材）、后勤组（负责物料、场地与日常保障）、统筹组（负责整体进度与突发处理）。

表 8 志愿者执行阶段岗位分工表

岗位	核心职责	交付产出
----	------	------

岗位	核心职责	交付产出
课程组	课程备课、试讲、授课、答疑	课程材料与授课服务
活动组	破冰与日常活动设计、执行	活动流程与现场组织
宣传组	影像记录、素材整理、内容撰写	活动记录与传播素材
后勤组	物料管理、场地保障、日常事务	平稳的运行支持
统筹组	进度管理、问题协调、每日复盘	执行节奏与问题闭环

岗位分工之外，执行阶段还运行着两条协作机制：**每日例会与问题上报**。每日例会在当天活动结束后召开，用 10 至 15 分钟同步当天情况、确认次日安排，保证信息在团队内及时流动；问题上报机制则明确“小事就地解决、大事上报统筹”，避免问题积压到不可控。这两条机制成本极低，却是多期活动没有出现重大执行事故的关键保障。

6.5 复盘阶段：让经验回到体系

很多团队把复盘做成“聚餐时聊两句”，项目团队则将复盘做成志愿者体系的固定环节。复盘包括三个层面：**志愿者反馈**——每位志愿者提交当期反馈，包括做得好的、做得不好的、建议改进的；**问题总结**——统筹组汇总执行中的共性问题，分类整理；**下一期优化**——将问题转化为下期的改进动作，写进方案和培训材料。

复盘阶段的核心机制是“反馈闭环”：每一条被采纳的建议，都要在下一期落地，并在下一期复盘回顾效果。只有形成“提出—采纳—落地—验证”的闭环，复盘才不会沦为形式。项目在流程依赖经验、缺少 SOP 的问题上反复出现，也正是因为早期复盘停留在“记录问题”层面，没有及时转化为标准化文档——这一问题的详细分析见第 10 章。

6.6 志愿者管理流程总览

将上述四个阶段串联起来，就形成了完整的志愿者管理流程：招募确认意愿，培训统一能力，执行交付服务，复盘沉淀经验；复盘的输出又回到招募与培训环节，形成循环。流程示意如下：

志愿者四阶段管理流程




图 4 志愿者四阶段管理流程

表 9 志愿者四阶段管理流程表

阶段	核心动作	关键产出	质量控制点
招募	渠道触达、报名筛选、线上面谈	志愿者名单与岗位匹配	动机与承诺确认
培训	集中培训、分组演练、试讲反馈	上岗认证	试讲通过再授课
执行	岗位分工、每日例会、问题上报	高质量服务交付	每日信息同步
复盘	反馈收集、问题总结、优化动作	改进清单	建议落地到下一期

6.7 志愿者的激励与留存

公益项目最怕“志愿者一届用完就走”，团队在激励与留存上做了三个层面的设计。**价值激励**：让志愿者看到自己的付出对学生产生的真实影响，例如学生在交流中表达的感谢、营期结束后的关系延续，这是最核心的激励。**能力激励**：通过培训、授课、组织工作锻炼表达能力与项目管理能力，让志愿服务成为简历上可写的实践经历。**情感激励**：通过团队氛围、结营仪式、往届志愿者社群，让志愿者产生归属感，愿意以“老带新”的方式继续参与。

从效果看，往届志愿者以带教身份回归、老志愿者转介绍新志愿者，说明留存机制初步生效；但整体看，志愿者复用率仍有提升空间，如何建立更完整的志愿者成长路径（从执行者到带教者、再到项目骨干），是志愿者体系下一阶段的重点课题。

第7章 项目运营闭环

7.1 为什么需要运营闭环

公益项目常见的死法有两种：一种是办完一届就散，原因是只有执行、没有沉淀；另一种是每年从零开始，原因是流程、经验和资源没有形成积累。这两种死法的共同根源，是项目缺少一个“让每一次运营都为下一次运营积累资产”的闭环机制。

运营闭环的价值在于：它把项目运行从“线性执行”变成“循环迭代”。线性执行是“策划—执行—结束”，做完就结束，经验随人流失；循环迭代是“执行—反馈—复盘—优化—再执行”，每一轮都为下一轮积累信息、方法和资产。项目能持续运营多年，核心机制就是把这个闭环真正跑了起来。

7.2 运营闭环总览

项目的运营闭环由十个环节构成：需求分析、项目策划、资源协调、志愿者招募、培训准备、宣传推广、活动执行、用户反馈、项目复盘、持续优化。十个环节首尾相连，形成循环：

项目运营闭环（十大环节）

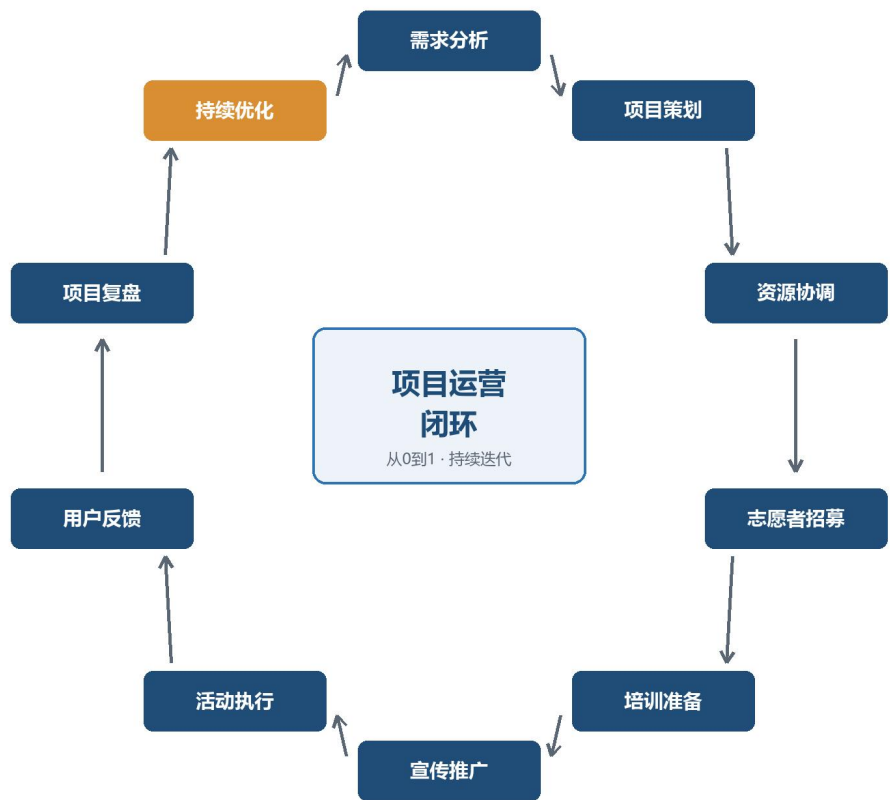


图 5 项目运营闭环流程图

需要说明的是，闭环不是“流水线”，每个环节的权重在不同阶段并不相同。例如，项目初期“需求分析”和“项目策划”的权重最高，因为方向错了后面全错；进入稳定运营期后，“用户反馈”和“持续优化”的权重上升，因为项目已经跑通，拼的是迭代质量。理解各环节的动态权重，是运营者与执行者的重要区别。

7.3 十大环节拆解

下面按“目标—关键动作—环节产出”的结构，对十个环节逐一拆解：

7.3.1 需求分析

目标是确认服务对象与真实需求。关键动作包括：梳理目标用户画像、收集用户痛点、判断需求优先级。环节产出是一份“需求清单”，即第 2 章表 1 所示的用户需求分析结果。需求分析的质量决定了后续所有环节的方向，任何“凭感觉上项目”的做法都会在这里埋下隐患。

7.3.2 项目策划

目标是把需求转化为可执行的项目方案。关键动作包括：设计产品形态（成长营）、规划内容模块、制定时间计划、评估资源需求。环节产出是项目方案书与课程大纲。策划阶段要坚持“先算账再开工”：算清需要多少志愿者、多少场地、多少时间，确认供给能够覆盖需求。

7.3.3 资源协调

目标是落实场地、人员、物料与外部支持。关键动作包括：联系学校确认合作、落实场地与排期、准备物料、协调各方时间。环节产出是可用的资源包。资源协调是公益项目最消耗精力的环节之一，也是“看起来不重要、出问题影响最大”的环节，需要提前规划、留出缓冲。

7.3.4 志愿者招募

目标是招募到匹配的志愿者并完成岗位预分配。关键动作包括：渠道宣传、报名筛选、线上面谈、岗位匹配。环节产出是志愿者名单与分工草案。招募的执行细节见第6章，这里只强调一点：招募的完成标准不是“人齐了”，而是“对的人到了对的岗位上”。

7.3.5 培训准备

目标是让志愿者达到上岗标准、让物料内容准备到位。关键动作包括：集中培训、分组演练、课程试讲、物料检查。环节产出是“可交付”的志愿者团队与完整物料清单。培训准备是质量控制最前置的关口，宁可在此环节多花时间，也不要再在执行期补救。

7.3.6 宣传推广

目标是让目标学生及其家庭知道项目、信任项目并参与报名。关键动作包括：地推宣传、学校沟通、报名通道维护、答疑跟进。环节产出是当期报名学生名单。宣传推广的效果直接影响服务规模，但项目早期主要依赖线下渠道，线上传播体系的建设相对滞后，具体分析见第8章。

7.3.7 活动执行

目标是在营期内按方案稳定交付服务。关键动作包括：每日流程执行、课程交付、一对一交流、每日例会与问题处理。环节产出是完整交付的服务体验。执行期是项目离用户最近的阶段，所有前期的设计、培训、协调，都要在这里接受检验。

7.3.8 用户反馈

目标是收集学生对服务的真实评价与建议。关键动作包括：反馈问卷、结营交流、志愿者观察记录。环节产出是当期用户反馈数据。用户反馈是闭环中承上启下的关键环节：没有反馈，复盘就只能“凭感觉”，优化也就无从谈起。项目早期在这一环节投入不足，是第 10 章问题 1 的直接原因之一。

7.3.9 项目复盘

目标是把执行经验转化为可复用的认知与文档。关键动作包括：团队复盘会、问题分类整理、经验文档输出。环节产出是复盘报告与改进清单。复盘的深度决定项目迭代的速度：只记录问题不复盘原因，问题会在下一期重演。

7.3.10 持续优化

目标是把复盘结论落地为下一期的改进动作。关键动作包括：优化方案、更新 SOP、迭代课程、修正流程。环节产出是“更成熟的下一期”。持续优化是闭环的“回填”动作，也是判断闭环是否真正运转的标志——如果优化没有发生，前面的复盘就只是形式。

7.4 闭环的关键控制点

十个环节如果平均用力，运营者会陷入“每个环节都做了、每个环节都一般”的状态。项目运行中真正值得重点控制的，是五个决定成败的关键控制点，汇总如下：

表 10 运营闭环关键控制点

控制点	风险表现	控制手段	控制时机
需求真实性	方向错误，服务无人需要	用户访谈、需求清单评审	项目策划前
供给匹配度	资源不足或闲置	资源测算、供需匹配表	策划阶段
志愿者上岗质量	交付质量参差	培训+试讲认证	活动开始前
执行期信息同步	问题积压、协调失灵	每日例会+问题上报	执行期间
复盘落地率	问题重复出现	改进清单跟踪	复盘后、下一期前

五个控制点对应五类最常见的失败模式：方向错、资源缺、交付差、协调乱、不迭代。项目多期运行的经验证明，只要守住这五个控制点，即使其他环节做得粗糙一些，项目也不会出现根本性风险；反之，任何一个控制点失守，都可能让前面所有的努力付诸东流。

第 8 章 内容传播运营

8.1 传播运营的定位

对公益项目而言，传播承担着三重功能：**触达**——让目标学生和家长知道项目存在；**信任**——通过真实内容建立家长和学校对项目的信任；**沉淀**——把项目的价值以内容形式保存下来，形成可检索、可转发的资产。三重功能对应三种传播场景：活动前的招募传播、活动中的过程传播、活动后的成果传播。

项目早期传播主要依赖线下地推和熟人网络，覆盖面有限且难以沉淀；进入持续运营期后，团队逐步搭建起以微信公众号为核心、学校渠道为辅助、媒体报道为背书的内容传播体系。这一体系的建设过程，本身就是项目从“会做”走向“会传播”的过程。

8.2 传播矩阵设计

项目的传播矩阵由三类渠道构成，分别承担不同功能，形成互补：

表 11 项目传播渠道矩阵

渠道	内容形式	核心功能	运营状态
微信公众号	活动记录、成长故事、成果展示	内容沉淀与信任建立	持续更新中
学校渠道	校内通知、老师推荐、地推活动	精准触达目标学生	每期活动前集中开展
媒体传播	遂昌融媒体等地方媒体报道	公信力背书与破圈	已有报道

注：媒体报道具体账号与报道链接后续补充，见第 9 章预留位。

三类渠道的功能差异决定了运营策略不同：公众号重“持续”，靠稳定的更新频率积累内容资产；学校渠道重“时机”，在每期招募窗口集中发力；媒体传播重“事件”，在项目有节点性成果时主动对接报道。把三类渠道当成一个组合来运营，比单点发力更有效。

8.3 微信公众号运营

微信公众号是项目线上运营的主阵地，内容方向主要有三类：**活动记录**——用图文记录每期成长营的筹备与执行过程，让读者看到项目“真实在发生”；**学生成长故事**——在保护隐私的前提

下，记录学生在项目中的变化与反馈，这是最能打动人、也最适合传播的内容类型；**项目成果展示**——定期呈现服务规模、内容模块与迭代成果，建立项目作为“持续运营案例”的认知。

从内容运营的角度看，公众号的核心指标不是阅读量，而是“三性”：**真实性**（记录真实发生的事，不摆拍、不夸大）、**连续性**（保持稳定更新，让关注者形成期待）、**可转化性**（内容最终能转化为下一期的报名与志愿者的加入）。围绕这三性，团队形成了“营期密集更新、平时沉淀发布”的节奏：活动期间高频产出图文素材，活动后整理发布，保持全年有内容输出。

需要坦诚指出的是，公众号运营目前仍处于“有内容、缺运营”的阶段：内容产出依赖活动周期，更新频率随团队精力波动；缺少系统的选题规划与数据复盘（如阅读、转发、关注转化）。这些问题属于“从 1 到 N”阶段的典型挑战，已在第 10 章复盘与第 11 章规划中列入改进方向。

8.4 学校渠道传播

学校渠道是项目触达目标学生的关键通路。每期活动前，团队通过学校沟通与活动宣传两个动作完成触达：一是与学校老师沟通项目信息，争取在校内通知渠道发布招募信息；二是配合线下地推，在学生和家长集中的场景进行面对面宣传。学校渠道的优势是精准——触达对象就是目标学生；劣势是依赖关系——学校合作的推进速度和深度，取决于前期沟通的信任积累。

学校渠道运营中沉淀的经验是：**把学校当作合作伙伴而非资源方**。沟通时讲清楚项目能给学生带来什么、需要学校提供什么支持、如何保障活动安全与秩序，让学校看到项目的专业性与安全性，而不是单纯“请求帮忙”。这种“价值互换”的沟通方式，比单纯要资源更可持续。

8.5 媒体传播与公信力建设

项目已获得遂昌融媒体相关报道，这是项目公信力建设的重要节点。地方媒体的报道对公益项目的价值有三层：**背书**——官方媒体的报道意味着项目通过了一定程度的审核与认可；**放大**——媒体报道触达的群体远超项目的自有渠道；**记录**——报道本身成为项目成果档案的一部分，可用于后续传播与资料沉淀。

媒体传播的运营原则是“先有内容，再谈报道”：媒体报道需要真实的成果与素材支撑，因此项目把日常的活动记录、学生反馈、数据整理做扎实，是获得媒体关注的前提。同时，媒体关系的维护要持续，不能“报道完就断联”，应定期向媒体同步项目进展，为后续报道积累素材。

第 9 章 项目成果展示

9.1 成果展示的设计思路

成果展示模块的设计目标，不是“晒成绩”，而是让读者快速建立对项目的完整认知：项目做了什么、影响了谁、留下了什么证据。因此，本章按“项目影响—用户反馈—媒体证明”三层组织，其中用户反馈与媒体证明部分预留展示位，待原始素材（截图、照片、报道链接）补充后替换。

9.2 项目影响

从结果维度看，项目的核心影响体现在三个层面：**持续运营**——项目自 2021 年发起，除个别年份受外部因素影响调整形式外，保持多年连续运营，形成了“每年暑期开展活动”的稳定节奏；**服务规模**——累计服务高中学生约 300 人次，覆盖多届学生，且服务内容从单一的课业支持扩展为学习、升学、规划、陪伴的综合支持；**青年培养**——项目培养了数批青年志愿者团队，志愿者在备课、授课、沟通、组织过程中获得真实的能力锻炼，部分志愿者以带教身份持续参与，形成人才梯队。

需要强调的是，上述影响不是某一次投入的结果，而是机制持续作用的结果。持续运营让每一期都成为上一期的延续：往届志愿者的带教经验进入培训环节，往期学生的反馈进入课程设计，公众号内容成为下一期招募的信任素材。成果与机制互为因果——正因为有机制，成果才能被持续生产；正因为有成果，机制才有继续运转的动力。这也是本报告将“成果展示”与“运营体系”“复盘分析”放在同一框架下呈现的原因。

表 12 项目成果数据总览（约值）

成果维度	数据口径	成果表现	说明
运营年限	2021 年至今	持续运营多年	逐年开展暑期活动
服务人次	约 300 人次	累计服务高中学生	2021—2026 年估算
学生单期规模	约 30—100 人	规模随运营节奏变化	峰值出现在 2023 年

成果维度	数据口径	成果表现	说明
志愿者规模	十几至约 30 人/期	稳定志愿供给	以准大学生为主
内容资产	公众号持续更新	活动记录与成长故事	素材待系统整理
媒体报道	遂昌融媒体等	公信力背书	链接待补充

9.3 用户反馈展示区

她真正的让我体会到就是那种有人是和你一起并肩作战的感觉，经过这次我也觉得我和别人的差距真的很大，她很贴心的，她上课会经常的关注我，虽然我都回答不上来，但是她会抛问题，让我答，让我原来不能参与的也参与进去，所以其实这几天学了的知识我到现在记忆还是比较深刻的，只能说能遇见她，我感到蓬荜生辉，谢谢相遇。

还有就是她的历史真的学习的好精湛，真的是绝了，会历史的女孩子最有气质了

4. 对老师的印象？*

还记得第一堂课的时候，那道题很难，但是我觉得挺有意思的，然后他故意说错了一个点，那是我第一次融入这个课堂，然后后面的几天一鸣老师都有耐心，教得很好（不接受反驳），会顾及到每个人，讲完一个题目会问我们是不是都会，做的时候也会下来辅导我们，他会来问我做好了没有，问我的答案写出来了没有，这让我很感动，可能也是人少，但还是很感谢的，他如果以后当一个老师我想他会是个很好的老师。下课的时候也会陪我们一起聊天，一起听歌，一起看MV，一起玩，很融洽的进去，是个好人。这几天的数学课我很开心，也有所收获。

5. 印象最深的事？*

小姜老师的课总是充满笑点，有次水瓶掉落，在上课的他被惊到，不知所措，手忙脚乱，活脱脱的表情包大户

小唐老师十分的温柔，无论在什么方面都是这样，令人喜爱

6. 对老师和活动想说的话。（夸的批评的我们都接受）*

老师真的十分友好，化学课难得觉得这么轻松愉快，两位老师十分尽责，会有些不舍

这个活动还是蛮好的，有时候真的可以说查漏补缺，就是时间比较短，没有更深入的了解

小何老师和小陈老师每次都很认真的批改作文，最后一天小何老师还请喝奶茶，十分的大方

6. 对老师和活动想说的话。（夸的批评的我们都接受）*

这七天下来收获还是比较多的，之前对于续写和应用文，不是很清楚，但是讲了这么七天，对于写作方面的理解更深了，两个老师都十分的温柔友好，课堂也十分的轻松愉快，认识了更多的人，收获也有，最后还是有点不舍的

最后一天的问卷

学生评价



校领导的支持和鼓励

9.4 媒体证明展示区

媒体证明用于展示项目的外部认可，主要包括媒体报道截图与报道链接。以下是预留展示区：



媒体报道



获奖证书

9.5 成果展示的呈现建议

最后给出成果展示模块的呈现建议，供读者在使用本报告时参考。第一，**先结论后证据**：在展示区开头用一句话概括项目成果（如“一个持续运营多年、累计服务约 300 人次学生的青年公

益项目”)，再展开证据。第二，**数据与故事并重**：数据建立理性认知，故事（学生反馈、志愿者经历）建立情感认同，两者缺一不可。第三，**预留位即行动计划**：尚未补充的素材，建议按本章给出的规范在 1 至 2 周内补齐，避免成果展示停留在“框架完整、证据空缺”的状态。

第四，**成果展示要与复盘分析衔接**。成果回答的是“项目做到了什么”，复盘回答的是“项目如何做得更好”，两者合在一起才构成完整的运营叙事：先用成果建立信任，再讲问题与改进展现思考深度，最后用未来规划收尾，呈现“能做事、会反思、有方向”的完整画像。这在面试展示和项目答辩场景中，是比单一成果罗列更有效的表达结构。

最后需要说明，成果展示的内容会随项目发展持续更新。建议项目组将本章视为“成果档案”的索引页，每期活动结束后同步更新数据与素材，使报告始终保持“活文档”的状态，而不是一次成型、永不维护的静态文件。

第 10 章 项目复盘分析

10.1 复盘框架：问题—原因—解决方案

本章是整份报告的“含金量”所在。复盘的目的不是证明项目做得好，而是诚实面对问题、找到原因、给出方案。项目运营多年，做得好的地方（方向选择、产品设计、持续运营）在前文已经充分展开，本章不再重复；这里聚焦项目最突出的三个问题，按“问题—原因—解决方案”的标准化结构逐一复盘，并在最后补充其他值得关注的可改进项。

复盘遵循三条原则：**问题要具体**——不写“沟通不畅”这类无法行动的空话，而是写清楚问题在哪个环节、以什么形式出现；**原因要追根**——不只写表面原因，而是追问机制层面的根源；**方案要可落地**——每个解决方案都能对应到具体的动作、负责人与验收方式。

10.2 问题 1：项目数据沉淀不足

问题表现：项目早期运营以活动执行为中心，对数据记录的重视不足。具体表现为：历年学生人数依赖团队记忆，缺少统一的报名与签到记录；用户反馈收集不系统，结营后的评价散落在聊天记录里；志愿者投入时长、课程完成情况等过程数据基本缺失。最直接的影响是：本报告在呈现规模数据时只能使用“约值”，无法给出精确数字，这对一个需要对外展示成果、对内支持决策的项目而言，是明显的短板。

原因分析：数据沉淀不足的根源不在“懒得记录”，而在机制缺位。其一，项目早期目标以“把活动办成”为主，团队的精力和考核重心都在交付端，数据采集没有进入标准化流程，属于“重要但不紧急”的事项，被持续搁置；其二，缺少统一的数据工具与字段规范，即使有人想记录，也不知道该记什么、记在哪里；其三，团队以学生志愿者为主，人员每年更替，没有专职的数据负责人，数据习惯无法跨期延续。

解决方案：建立项目数据库，把数据采集嵌入运营流程，而不是“事后补记”。具体分三步推进：第一步，定义数据字段，统一“学生报名、出勤、课程参与、满意度、志愿者投入”五类核心数据的采集项，形成《数据采集字段表》；第二步，确定数据工具，使用在线表格等轻量工具搭建数据库，设定固定模板，由专人（每期一名数据负责人）维护；第三步，把数据采集写进 SOP，在报名、每日执行、结营、复盘四个节点设置数据采集动作，让“记录”成为流程的一部分。

表 13 问题 1 复盘：数据沉淀不足

复盘维度	内容	关键动作	验收标准
问题表现	人数靠记忆、反馈散落、过程数据缺失	盘点现有数据缺口	形成缺口清单
问题原因	机制缺位、工具缺失、无专人负责	明确数据负责人与工具	数据库上线
解决方案	建立项目数据库、嵌入运营流程	定义字段、搭建库、写入 SOP	下期数据完整率 ≥90%

10.3 问题 2：流程依赖经验

问题表现：项目流程长期依赖“有经验的老人带新人”的口头传递，缺少标准化的书面文档。典型场景是：每期活动的筹备动作、课程安排、执行分工散落在不同人的聊天记录和记忆里；新团队接手时，需要从头“考古”式地了解项目曾经怎么做的；同一个环节在不同期次的做法不一致，质量随人波动。

原因分析：流程依赖经验的根源有两个。一是“沉淀成本”被低估：写 SOP 需要时间，而项目团队以短期参与的学生志愿者为主，当期目标是把活动办完，沉淀文档的收益在当期看不到，理性选择自然是“先不写”；二是缺少 SOP 的“使用场景”：即使写了文档，如果没有在新人培训、执行检查中强制使用，文档也会被束之高阁。换言之，不是大家不想写，而是写了没人用、用了没反馈，形成了恶性循环。

解决方案：形成覆盖核心环节的 SOP 体系，让经验从“人”沉淀到“文档”，再让文档在流程中“活”起来。优先沉淀三类 SOP：**招募 SOP**（招募渠道、筛选标准、面谈问题、时间节点）、**活动执行 SOP**（筹备清单、每日流程、岗位分工、突发事件处理）、**复盘 SOP**（复盘会流程、问题分类模板、改进清单跟踪）。同时配套两个使用机制：新人培训必须通读对应 SOP 并通过“SOP 问答”考核；每期执行后由执行者修订 SOP，标注“本期优化点”，让文档持续生长。

表 14 问题 2 复盘：流程依赖经验

复盘维度	内容	关键动作	验收标准
问题表现	口头传承、做法不一、质量随人波动	盘点核心流程现状	流程缺口清单

复盘维度	内容	关键动作	验收标准
问题原因	沉淀成本高、缺少使用场景	建立 SOP 使用与修订机制	SOP 纳入新人培训
解决方案	形成招募/执行/复盘三类 SOP	撰写 SOP、培训考核、定期修订	三类 SOP 上线并落地

10.4 问题 3：活动结束后用户连接不足

问题表现：成长营期间志愿者与学生建立了较好的信任关系，但营期结束后，大部分连接随时间衰减：暑期结束后学生回到学校、志愿者进入大学，双方的交流频率明显下降；项目缺少常态化的线上交流场景，学生在后续学习中遇到问题，缺少稳定的求助渠道；对项目而言，用户的长期价值（复购参与、口碑传播、案例沉淀）没有被充分经营。

原因分析：连接衰减是关系的自然规律，但项目的问题在于没有设计“抗衰减”机制。其一，项目以“营期交付”为运营单元，活动的终点设计在了结营日，缺少对“结营之后”的运营规划；其二，缺少长期线上交流的载体与运营者——公众号承担了“发布”功能，但没有承担“连接”功能，没有形成学生与志愿者可日常交流的社群场景；其三，团队精力的现实约束，暑期结束后团队进入开学季，人手与精力难以维持高频运营。

解决方案：建立长期线上交流机制，把“一次性活动”升级为“长期关系”。具体设计包括：建立线上交流群，营期结束时不解散，保留学生与志愿者的交流空间，由往届志愿者轮值答疑；设定低频但稳定的运营节奏，如每月一次主题分享（学习方法、大学见闻）、每学期一次回访交流，保持连接温度；将线上交流纳入志愿者运营体系，轮值答疑计入志愿服务时长与反馈，避免“长期机制”变成“无人维护的空群”。

表 15 问题 3 复盘：活动后用户连接不足

复盘维度	内容	关键动作	验收标准
问题表现	营后连接衰减、缺少常态交流场景	梳理用户连接现状	连接触点清单
问题原因	运营单元止于营期、载体与人力缺位	设计长期连接机制	机制方案评审通过
解决方案	线上交流群+低频稳定运营	建群、排期、轮值答疑	连续运营并产生互

复盘维度	内容	关键动作	验收标准
			动记录

10.5 其他值得关注的可改进项

除上述三个核心问题外，复盘还识别出三个值得持续关注的可改进项，供项目团队在后续运营中逐步完善：

- **传播内容的连续性：**公众号更新随活动周期波动，缺少全年选题规划。建议建立内容日历，把“营期高频更新、平时主题发布”的节奏固定下来，形成稳定的内容供给。
- **志愿者的成长路径：**目前志愿者以“执行者”角色为主，从执行者到带教者、再到项目骨干的成长路径不够清晰。建议为志愿者设计阶梯式角色与对应的培训内容，提升复用率与梯队厚度。
- **需求的动态更新：**项目前期的需求分析以定性梳理为主，且几年未做系统更新。建议在每期活动后开展小样本的用户访谈，动态验证需求是否变化，避免“用几年前的需求设计今年的产品”。

10.6 复盘结论：项目所处的位置

把三个核心问题放在一起看，可以得出一个总体判断：**项目已经完成了“从 0 到 1”，正处于“从 1 到 N”的临界点。**“从 0 到 1”阶段的成功要素——真实需求、最小验证、产品结构、志愿者体系、运营闭环——项目已经具备；“从 1 到 N”阶段的核心能力——数据驱动、标准化、长期用户经营——正是三个问题对应的短板。换言之，问题的出现不是项目失败的信号，而是项目进入新阶段的标志。下一阶段的工作，就是围绕这三个短板建立能力，让项目从“靠团队个人能力运转”升级为“靠机制运转”。

第 11 章 未来规划与可复制性

11.1 下一阶段的迭代方向

基于第 10 章的复盘结论，项目下一阶段的迭代方向可以概括为“一个中心、三条主线”：以“把项目做成可复制、可传承的运营案例”为中心，围绕数据、标准、连接三条主线推进。

数据主线对应问题 1：建设覆盖全流程的项目数据库，让每期运营产生可分析、可比较的数据资产；标准主线对应问题 2：完成招募、执行、复盘三类 SOP 的撰写与落地，让新团队可以按文档接手项目；连接主线对应问题 3：建立长期线上交流机制，把用户关系从“营期关系”升级为“长期关系”。三条主线相互支撑：数据为优化提供依据，标准为传承提供载体，连接为价值提供延续。

在节奏安排上，建议采用“一期一目标”的方式推进，不在同一期同时铺开过多改革：下一期重点完成数据库搭建与数据采集，同步启动招募 SOP；再下一期推进执行 SOP 与复盘 SOP；连接机制在数据库稳定后上线，避免“为了连接而建群、建了群没人运营”的反弹。渐进式迭代，比一步到位更符合学生团队资源现实。

从时间表上看，建议以三个暑期为周期完成能力建设：第一个暑期完成数据基础设施建设，并验证数据采集流程在真实执行中的可行性；第二个暑期完成三类 SOP 的落地与修订，让新团队能够按文档接手核心环节；第三个暑期上线长期连接机制并评估效果。每个暑期结束后，对照第 10 章的三张复盘表验收改进是否到位，形成“规划—执行—验收”的小闭环，与项目既有的运营大闭环嵌套运行。

11.2 项目的可复制模型

“为你撑伞”模式能否被复制到其他地区、其他学段？从项目经验看，可复制的不是“暑期成长营”这个具体产品，而是产品背后的模型。这个模型包含四个要素：**可迁移的真实经验**（志愿者自身的升学/成长经验）、**轻量的交付结构**（7 至 8 天集中营期+模块化服务）、**低成本的组织方式**（准大学生志愿者+学校支持）、**可持续的运营机制**（招募—培训—执行—复盘闭环）。四要素中，前三个决定项目能否跑通，第四个决定项目能否持续。

复制到新场景时，需要做三个本地化调整：调整服务对象（如复制到初中阶段或县域小学，需重新做需求分析）；调整供给来源（如高校资源不足的地区，可联合本地大学生或返乡大学

生)；调整合作模式(不同学校的合作意愿与支持方式不同，需重新设计资源协调方案)。模型可复制，但落地必须本地化，这是项目经验中最重要的一条认知。

需要如实说明的是，模型迁移的边际成本主要集中在初期：新场景的需求分析、本地资源摸排、首批志愿者培训都需要一次性投入。团队的经验表明，前期投入 1 至 2 个月的筹备时间，足以显著降低复制过程中的返工成本；反之，跳过需求分析与本地化调整直接照搬方案，往往会在执行期付出更高的代价。这也是“从 0 到 1”阶段最值得被沉淀下来的教训之一。

11.3 标准化资产清单

为了让项目经验真正沉淀为团队资产，建议建立如下标准化资产清单，作为项目“家底”的目录：

表 16 项目标准化资产清单

资产类别	资产内容	当前状态
方向文档	项目定位、需求清单、理念说明	已有，建议定期修订
产品文档	成长营方案、课程大纲、每日流程表	已有，随迭代更新
志愿者文档	招募标准、培训材料、岗位分工表	部分已有，待 SOP 化
流程 SOP	招募/执行/复盘三类 SOP	待建设（见第 10 章）
数据资产	项目数据库、历年数据速查表	待建设（见第 10 章）
内容资产	公众号文章、活动照片、报道素材	已有，待系统归档
复盘资产	历期复盘报告、改进清单	部分已有，待标准化

11.4 结语：从 0 到 1，再到长期主义

复盘到这里，可以回到报告最初的问题：一个没有资金、没有专职团队的学生公益项目，凭什么能持续运营多年？答案是四个关键词：**真实**——项目解决的是发起者亲身经历过的真实问题，这是项目最深的护城河；**验证**——项目用最小成本完成模式验证，避免了盲目投入；**结构**——产品、组织、流程都形成了可复用的结构，使项目不依赖某个人；**闭环**——运营闭环让每一期都为下一期积累资产。

同时，复盘也诚实地暴露了项目的边界：数据、标准、长期连接这三项能力尚未建立，项目仍处在“从 1 到 N”的临界点。对读者而言，这个状态本身就是最有价值的案例素材——一个真实项目最动人的部分，不是它已经完美，而是它清楚知道自己在哪里、要去哪里、以及怎么去。愿这份复盘报告，能成为项目下一阶段运营的第一份“地基文档”，也能为正在做或想做类似项目的人提供一份可参考的路线图。

附录

附录 A 项目数据速查表

下表汇总本报告涉及的核心数据，便于读者快速查阅与核对口径：

表 A-1 项目数据速查表

数据项	数据口径	说明
项目发起时间	2021 年 3 月	筹备启动
首次验证时间	2021 年 7 月	线上形式
正式落地时间	2022 年 8 月	线下成长营
累计服务人次	约 300 人次	2021—2026 年估算
学生单期规模	约 30—100 人	峰值在 2023 年
志愿者单期规模	十几人至约 30 人	第二期约 20—30 人
成长营周期	约 7—8 天	模块化结构
媒体传播	遂昌融媒体等	报道链接待补充

注：所有数据均为约值或估算，精确数据待项目数据库建成后更新。
